


Resumé kring dammprojektet 2014-02-22:

För att kunna genomföra det vi tänkt enligt plan är det alldeles nödvändigt med en tid av ordentlig kyla och tjäle i marken. Den är nämligen en förutsättning för att dumpertransporterna ska kunna genomföras.

Nu är våren alldeles för nära, och vi tvingas därför att övergå till vår plan B.

Plan B har inget att göra med det som nämns som alternativ B i Miljökonsekvensbeskrivningen.

Plan B är endast en temporär lösning och den ursprungliga planen kommer att fullföljas nästa vinter. Trots plan B så kommer vi ändå att få en fin damm till sommaren, även om inte vissa saker kan slutföras som det är tänkt.

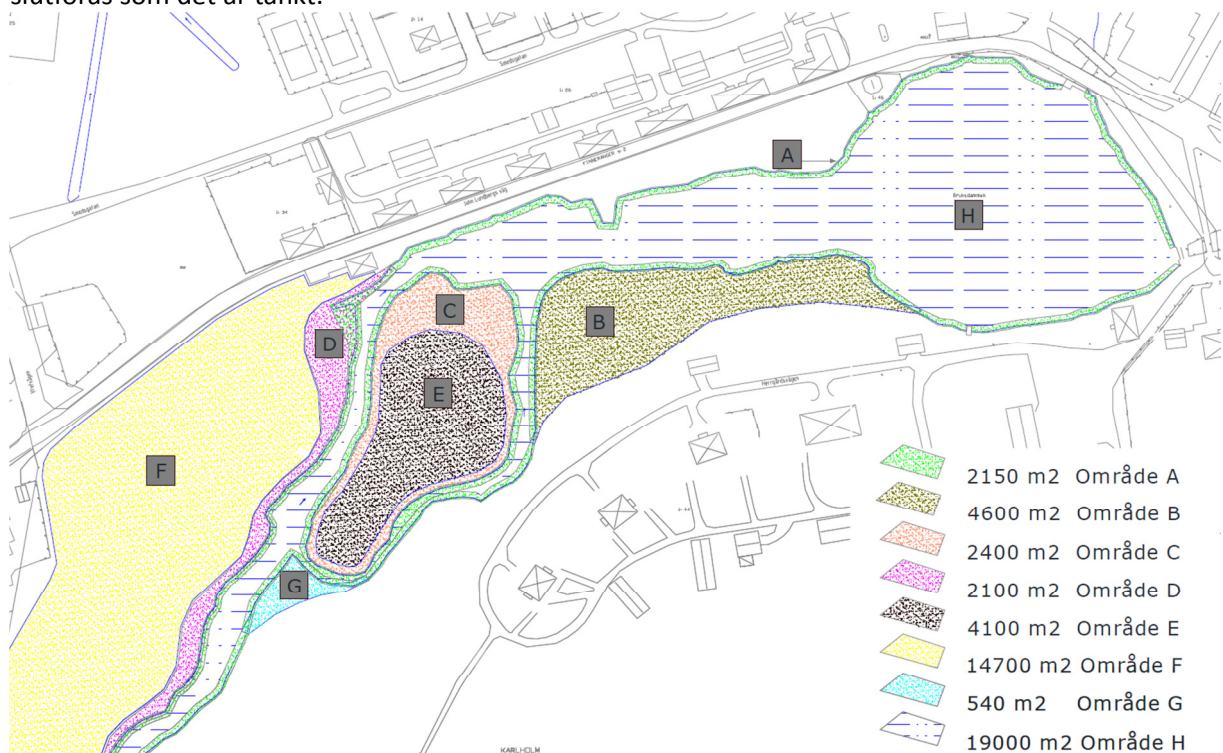

Plan B innebär att:

- Område A (hela strandlinjen) kommer att rensas som planerat.
- Område B kommer inte att grävas bort som planerat men, kanten rensas och snyggas till. Ett tunnare lager av massor läggs upp på området för att jämna till och få en yta där man kan gå.
- Område C genomförs som planerat.
- Område E genomförs som planerat.
- Område F är det område där den uteblivna tjälen får största påverkan. De volymer av massor som är nödvändiga för att fylla upp området kan inte transporteras hit (mestadels massor från område B). Området kommer att fyllas upp så långt som det är möjligt, hur stort och hur mycket kan vi inte säga i nuläget. Målet är dock att det skall bli så stort att det går att anlägga gångstråk med bro över till område F.
- Område G är troligtvis inte genomförbart då det är väldigt sankt kring området och dålig bärighet.
- Område H kommer troligtvis att pumpas till område F. Hur mycket det bidrar till att höja marken får vi se.
